



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (για αναθεωρήσεις) του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».

Στη Λάρισα σήμερα 17-01-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 1484/12-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Διαμάντος Κων/νος και 9) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (για αναθεωρήσεις) του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 787/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
4. Τη με αριθμ. 788/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
5. Τη με αριθμ. 836/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
6. Τη με αριθμ. 34/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
7. Τη με αριθμ., 35/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
8. Τη με αριθμ., 140/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
9. Τη με αριθμ., 163/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού), 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων»
10. Τη με αριθμ., 198/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 1000/09-01-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (για αναθεωρήσεις) του έργου:


«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ποσού ευρώ : 157.858,71 (127.305,41 + 30.553,30 Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι μεγαλύτερης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους.

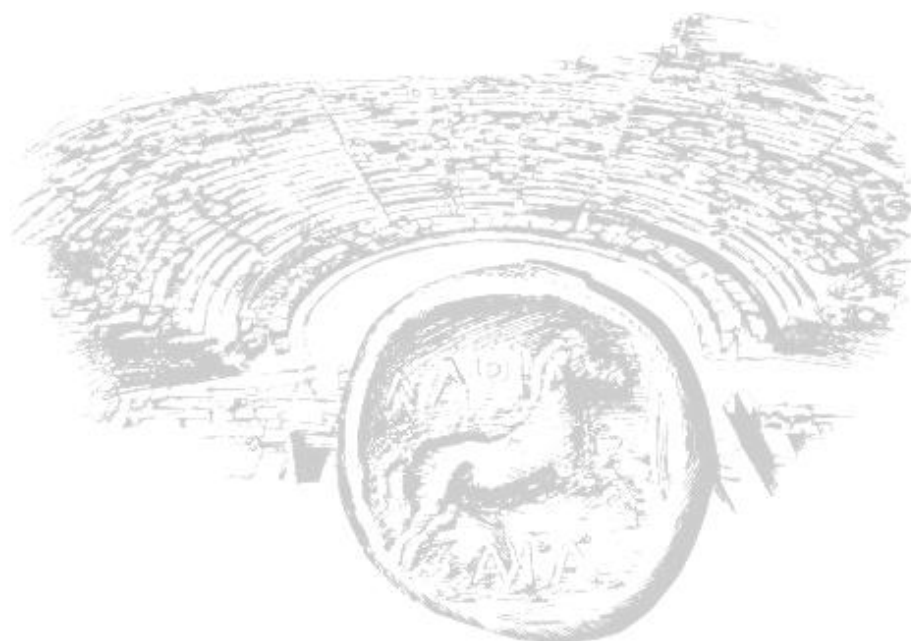

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
			(EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	105.645,16	25.354,84	131.000,00
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	102.475,81	24.594,19	127.070,00
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	6.244,42	1.498,66	7.743,08
3. ΣΥΜΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	108.720,19	26.092,84	134.813,03
5. <u>ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2ο Α.Π.Ε.</u>			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	127.305,41	30.553,30	157.858,71
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	18.585,22	4.460,45	23.045,67

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης)..... **127.070,00 euro**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Συμπληρωματικής Σύμβασης)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... **7.743,08 euro**
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις..... **23.045,67 euro**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%).....**157.858,71 euro**

ΛΑΡΙΣΑ 9 - 1 - 2024

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

12. Την από 24-11-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

3 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	131.000,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	127.070,00
Μέσο ποσοστό έκπτωσης	3,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	08/11/22
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	15/12/22
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	15/02/23
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	15/06/2023

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση εργασιών, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης του Α' τριμήνου 2023.

Το συνολικό ποσό του παρόντα 3ου Α.Π.Ε. είναι αυξητικό κατά 7.735,12 € σε σχέση με την σύμβαση.

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 157.858,71 € .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	89.109,40	108.720,19	108.720,19	0,00	19.610,79
Απρόβλεπτα	13.366,41	0,00	0,00	13.366,41	0,00
Άθροισμα	102.475,81	108.720,19	108.720,19	13.366,41	19.610,79
Ποσοστό Μεταβολής				6,09%	
Αναθεώρηση	0,00	0,00	18.585,22		
Συνολικό Ποσό	102.475,81	108.720,19	127.305,41		
Φ.Π.Α. 24%	24.594,19	26.092,85	30.553,30		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	127.070,00	134.813,04	157.858,71		

Μετά απο τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Λάρισα 24/11/2023

Η Επιβλέπουσα

ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η αν. Πρ/νη Τμ. Συντ.
Δημοτικών Κτιρίων

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. Πρ/νος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

13. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανάδοχος : ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

3ος Ανακεφαλαιωτός Πίνακας Εργασιών

Σελίδα : 2

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μον. Μτρ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΙΕ		ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΕ (3%)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΕΓΜΕΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μισθός Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μισθός Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μισθός Ευρώ	Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία	Ολική	
Αρχική σύμβαση														
Εργασίες προυπολογισμού														
Νέο Γκρουπ														
1	Καθαρίσει φθονος οργανισμό (ύλινος στίβος)	m3	1	56,00	898,00	16,87	56,00	893,52	16,87	56,00	893,52	37,52		ΟΙΚ 5276
2	Καθαρίσει επικεφαλές στον χώρο να καθαριστεί παρσόλ για την υγιεινή των εργαζομένων	m2	2	960	6.432,00	1.023,03	6,70	6.854,30		6,70	6.854,30	422,30		ΟΙΚ 2241
3	Μίτσα σρά υλικόν με τα χίτρα	ton x 10 m	3	250	1.400,00	266,88	5,60	1.464,53		5,60	1.464,53	94,53		ΟΙΚ 1126
4	Φορτωμένα τα προϊόντα τεσσάρων χώρες χρήση μηχανών μέσα χώρες την εφορμή των προϊόντων	m	4	60	260,00	66,72	5,00	333,60		5,00	333,60	83,60		ΟΙΚ 2173
5	Μίτσα σρά με αυτοκίνητο δια μέσου εδάφ καλής βατότητας	ton.k	5	3.128,05	1.094,92	3.469,44	0,35	1.214,30		0,35	1.214,30	119,48		ΟΙΚ 1196
6	Υδρορρόση από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοστή εργοστασιακή	kg	6	600	9.738,00	701,48	10,23	11.385,02		10,23	11.385,02	1.647,02		HAM 1
7	Υδρορρόση από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σαλιναγή ευκαλί	kg	7	180	14,34	482	14,34	6.911,88		14,34	6.911,88	4.330,88		HAM 1
8	Συλλεκτήρας υδάτων Στίβος (οντόξ)	m2	8	8,8	349,08	9	39,77	357,03		9	357,03	7,95		HAM 1
9	Υγιεινή στήλη από ύδατα πηστή	m3	9	16	460,00	16,87	460,00	7.501,50		16,87	7.501,50	301,50		ΟΙΚ 5280
10	Συνάβα με στίβος με μισόβατος πάχους 1,8 cm	m2	10	864	16.416,00	953,03	19,00	18.107,57		19,00	18.107,57	1.691,57		ΟΙΚ 5282
11	Επίστρωση με ελαστομερή υδρομπετόνη με βράνη	m2	11	960	7.584,00	1.023,03	7,90	8.081,94		7,90	8.081,94	467,04		ΟΙΚ 7912
12	Επιπλάση με κεραμίδια ομαλούς τύπου	m2	12	960	22.560,00	1.023,03	23,50	24.041,21		23,50	24.041,21	1.481,21		ΟΙΚ 7211
13	Χρωματισμο επί επιφανειών παρκοσιμων με χρωματα υδατινής διαστοράς, αερματικής, σφραγιστικής ή πολυμερικής βάσης εστερικών τριφαινικών με χρήση χρωμάτων, αερματικής σφραγιστικής-αερματικής ή σπινδύλων κινητήρων από ραβδους συνήθων διατομών.	kg	14	100	900,00	256,94	9,00	2.312,46		9,00	2.312,46	1.412,46		ΟΙΚ 7895.1
Σύνολο Νέο Γκρουπ					77.852,00		4,50		89.529,76		89.529,76	12.127,76	-460,00	
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %			18,00 %			18,00 %			
Αθροισμα Αφαίρεται (επιση)					3,00 %			3,00 %			3,00 %			
Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού					89.100,40			102.475,77			102.475,77	13.881,44		
Απρόβλεπτη διατάξη					13.366,41			102.475,77			102.475,77	13.881,44		
Σύνολο					102.475,81			102.475,77			102.475,77	13.881,44		
Πρόβλεψη αναθεώρησης					102.475,77			102.475,77			102.475,77	13.881,44		
Σύνολο					24.594,19			24.594,18			24.594,18	18.885,22	18.885,22	
Γενικό σύνολο σύμβασης					24,00 %			24,00 %			24,00 %			
1η Συμπληρωματική Σύμβαση					127.070,00			127.068,95			127.068,95	460,00		
Εργασίες προυπολογισμού														
Νέο γκρουπ														
1	Ψ υδροσφή σπείρα από γυνοσανίδες	m2	N T			20	22,50	460,00		22,50	460,00	460,00		ΟΙΚ 7899
			1-1											
Σύνολο								460,00			460,00	460,00		

3ος Ανακεφαλαιωτός Πίνακας Εργασιών

Σελίδα : 3

Α/Α	ΕΜΒΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μεν Μητρ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3%)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ Επιπέδων	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ Επιπέδων	ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Εργα	ΔΑΠΑΝΕΣ Μικρή Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Εργα	ΔΑΠΑΝΕΣ Μικρή Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Εργα	ΔΑΠΑΝΕΣ Μικρή Ολική				
	Από μεταφορά															
2	Επισκευή ψυλοποραφ (πυλ. τύπου	m2	NT				730	0,50	4746,00					4746,00		01Κ.2275
	Σύνολο Νέο Υφασμα		2.1						5.195,00					5.195,00		
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	935,10					935,10		
	Αθροισμα Αφαίρεται (κτιμικη)							3,00 %	183,90					183,90		
	Σύνολο: Έργα της προαπολογισμού								5.946,20					5.946,20		
	Απολογιστικές εργασίες															
	ΑΕΚΚ															
1	ΑΕΚΚ						253,89	1,00	253,89					253,89		01Κ.2275
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	45,70					45,70		
	Αθροισμα Αφαίρεται (κτιμικη)							3,00 %	1,37					1,37		
	Σύνολο ΑΕΚΚ								298,22					298,22		
	Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες								298,22					298,22		
	Σύνολο σύμβασης								6.244,42					6.244,42		
	Προστίθεται ΦΠΑ							24,00 %	1.498,66					1.498,66		
	Γενικό σύνολο σύμβασης								7.743,08					7.743,08		

3ος Ανακεφαλαίωτικός Πίνακας Εργασιών

Σελίδα: 4

Υπερβάσεις συμπληρωματικών συμβάσεων	Αρχική σύμβαση	Συμπληρωματικές συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο	89.109,40	6.244,42	
Απρόβλεπτη δαπάνη	13.366,41		Υπερβαση της αρχικής σύμβασης κατά 6.244,42 ή ποσοστό 7,01%
Αθροισμα	102.475,81	6.244,42	
Πρόβλεψη ανασθεώρησης			Υπερβαση της αρχικής σύμβασης κατά 6.244,42 ή ποσοστό 6,09%
Αθροισμα	102.475,81	6.244,42	
ΦΠΑ	24.594,19	1.498,66	Υπερβαση της αρχικής σύμβασης κατά 6.244,42 ή ποσοστό 6,09%
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	127.070,00	7.743,08	Υπερβαση της αρχικής σύμβασης κατά 7.743,08 ή ποσοστό 6,09% Δηλαδή Ευρώ επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία και οκτώ λεπτά
Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	108.720,19	108.720,19	Χωρίς μεταβολή
Απρόβλεπτη δαπάνη			
Αθροισμα	108.720,19	108.720,19	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη ανασθεώρησης		18.585,22	
Αθροισμα	108.720,19	127.305,41	Υπερβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 18.585,22 ή ποσοστό 17,09%
ΦΠΑ	26.092,84	30.553,30	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	134.813,03	157.858,71	Υπερβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 23.045,68 ή ποσοστό 17,09% Δηλαδή Ευρώ είκοσι τρεις χιλιάδες σαράντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτά
24/11/2023 Ο ανάδοχος	24/11/2023 Η επιβλέπουσα	ΘΕΡΡΩΘΗΚΕ /11/2023 Ο Αν. Πρώτος Διευθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Ο Αν. Πρώτος Διευθ. Τεχνικών Υπηρεσιών	
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΒΑΙΩΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΕΛΗΠΟΥΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΡΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΔΟΝΑΤΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (για αναθεωρήσεις) του έργου: “Έπισκευή στεγών 10^{ου} & 39^{ου} Δημοτικών Σχολείων» αναδόχου: Λιαπόπουλος Βάϊος & Σια Ε.Τ.Ε, ποσού 157.858,71€ (127.305,41 + 30.553,30 Φ.Π.Α. 24%), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ****ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
